


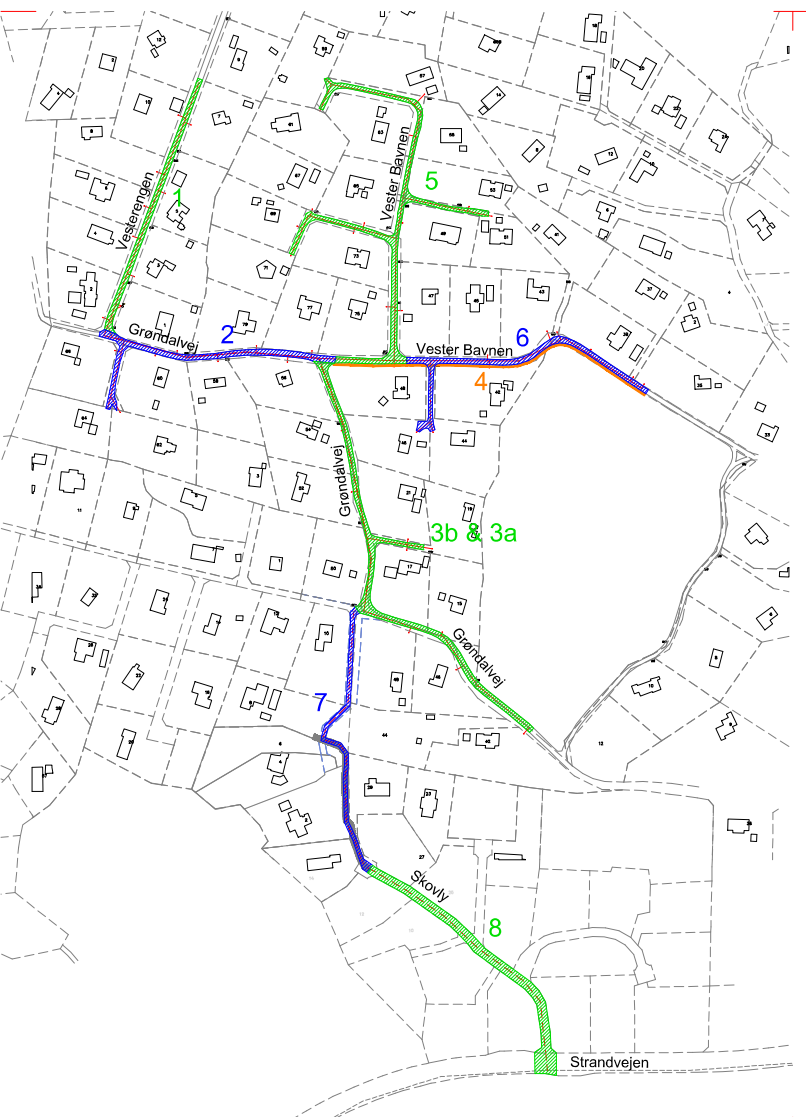

NOTE:

Tidsplanen viser den forventede graverækkefølge og det anslåede tidsforbrug. Der kan ske uforudsete ting, der forskyder tidsplanen. Ved forsinkelse kan entreprenøren ligeledes være nødsaget til at arbejde flere steder samtidigt, da vi har valgt at prioritere at alle anlægsarbejder bliver færdig inden påske.

Der arbejdes ikke i skolernes juleferie (uge 51 og 52)

Tidsplanen kan skubbes i tilfælde af hård vinter med sne og/eller frost.

SIGNATUR:

-  Kloaktracé (Hvor der graves)
-  Spildevandsledning
-  Omlægning af HS-kabel i sydsiden af vejen



Tidsplan:

Område	Graveperiode	Etape
Opstart	-	0
Vesterengen	-	1
Grøndalvej (hen til Vester Bavn)	-	2
Grøndalvej (resten)	-	3a & 3b
Omlægning af højspændingskabler	-	4
Vester Bavn (nord)	uge 1-5	5
Vester Bavn (øst)	uge 5-8	6
Nålevej og Grøndalvej 19-21	uge 9	7
Skovly inkl. tilslutning ved Strandvejen	uge 9-11	8
Retableringsarbejder	uge 10-12	9
Projektet forventes afsluttet senest i	uge 13 2022	

Revideret d. 03.03.2022

FULDENDT Rådgivende Ingeniører			Bygherre:	Fane Vand Spildevandsforsyning	Sag nr.:	215993
			Projekt:	Kloakering af Grøndalsområdet	Målestok:	1:2500
VARDE FULDENDT Østervang 2 DK-6800 Varde			ESBJERG FULDENDT Dokken 10 1. th DK-6700 Esbjerg		KONTAKT (+45) 75 22 40 88 kontakt@fuldendt.dk www.fuldendt.dk	
Udgivet d.:			Tegnet: DHS		Kontrol: PML	Godk.: CTK

M 1.010 Kloaktracé.dwg

A3
