


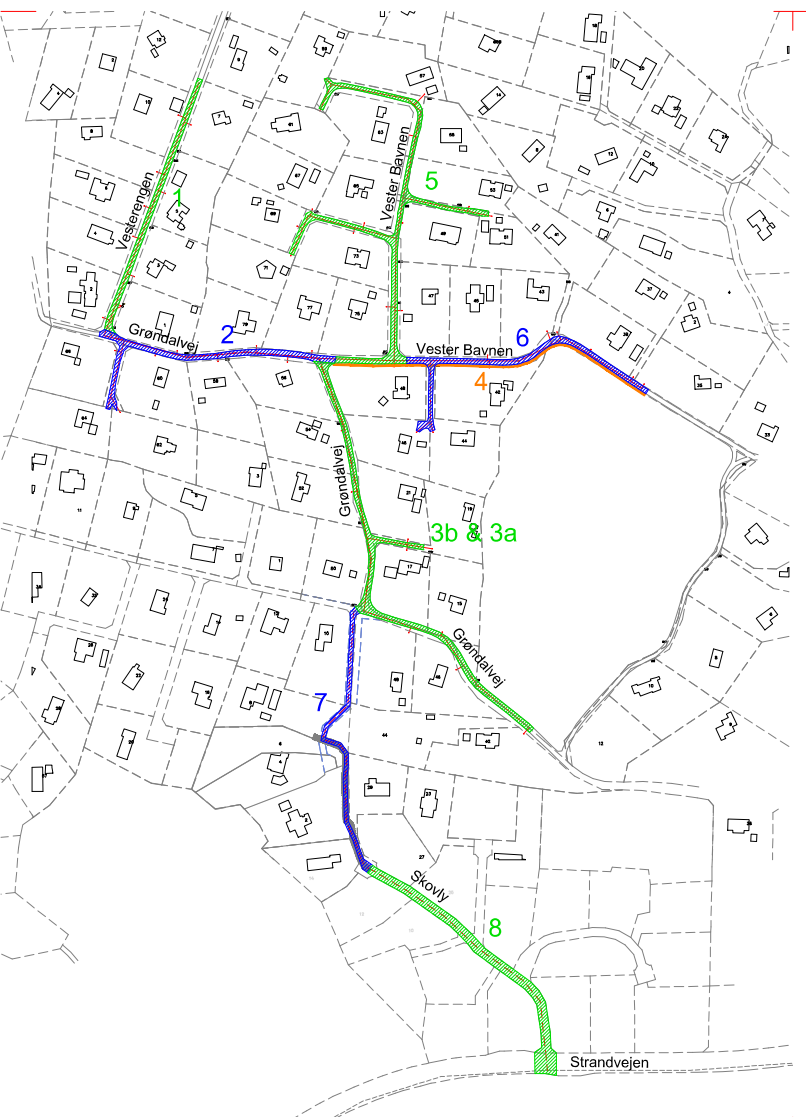

NOTE:

Tidsplanen viser den forventede graverækkefølge og det anslåede tidsforbrug. Der kan ske uforudsete ting, der forskyder tidsplanen. Ved forsinkelse kan entreprenøren ligeledes være nødsaget til at arbejde flere steder samtidigt, da vi har valgt at prioritere at alle anlægsarbejder bliver færdig inden påske.

Der arbejdes ikke i skolerens juleferie (uge 51 og 52)

Tidsplanen kan skubbes i tilfælde af hård vinter med sne og/eller frost.

SIGNATUR:

-  Kloaktracé (Hvor der graves)
-  Spildevandsledning
-  Omlægning af HS-kabel i sydsiden af vejen

Tidsplan:

Område	Graveperiode	Etape
Opstart	-	0
Vesterengen	-	1
Grøndalvej (hen til Vester Bavn)	-	2
Grøndalvej (resten)	-	3a & 3b
Omlægning af højspændingskabler	-	4
Vester Bavn (nord)	uge 1-5	5
Vester Bavn (øst)	uge 5-8	6
Nålevej	uge 9-10	7
Skovly inkl. tilslutning ved Strandvejen	uge 11-12	8
Retableringsarbejder	uge 13	9

Projektet forventes afsluttet senest i uge 13 2022

Revideret d. 28.01.2022

FULDENDT Rådgivende Ingeniører			Bygherre: Fane Vand Spildevandsforsyning	Sag nr.: 215993
			Projekt: Kloakering af Grøndalsområdet	Målestørrelse: 1:2500
VARDE FULDENDT Østervang 2 DK-6800 Varde			ESBJERG FULDENDT Dokken 10 1. th DK-6700 Esbjerg	KONTAKT (+45) 75 22 40 88 kontakt@fuldendt.dk www.fuldendt.dk
Udgivet d.:			Tegnet: DHS	Kontrol: PML
			Godk.: CTK	
